

Beruházói éves jelentés

Végleges

**A KOM Központi Okos Mérés Zrt. beruházói éves
jelentése az Intelligens Hálózat Mintaprojektről**

2017

Budapest, 2018. április 9.



Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés.....	3
2.	Részletes jelentés	4
2.1.	A tárgyév során a beruházással kapcsolatban felmerült költségek	4
2.2.	A tárgyév során a KOM Zrt. részére folyósított támogatások.....	4
2.3.	A beruházás fizikai előrehaladása a tárgyév során.....	4
2.4.	A beruházás végrehajtását akadályozó rendkívüli események bemutatása.....	10
2.5.	A beruházás megvalósításának a tárgyévet követő évben tervezett ütemezése	11



1. Bevezetés

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2003/87/EK irányelv (a továbbiakban: „**Irányelv**”) 10c. cikke lehetőséget biztosított arra, hogy a Magyar Állam átmenetileg „ingyenes” CO₂ kvótákat bocsásson ki, amennyiben a Bizottság által támogatható Derogációs Kérelmet (a továbbiakban: „**Derogációs Kérelem**”) és – annak részeként – olyan Nemzeti Tervet (a továbbiakban: „**Nemzeti Terv**”) terjeszt elő, amely alkalmas az energiahatékonysági szempontok érvényesítésére. Az átmeneti kiosztás (a továbbiakban: „**Derogációs Kiosztás**”) lényege, hogy az abból származó bevételt a Magyar Állam olyan beruházásokra fordíthatja, amelyek az energetikai infrastruktúra modernizálását és felújítását szolgálják. Ennek megfelelően a Magyar Állam által benyújtott Derogációs Kérelemben rögzítésre került a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (a továbbiakban: „**MAVIR Zrt.**” vagy „**Alapító**”), illetve annak kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, a KOM Központi Okos Mérés Zrt. (a továbbiakban: „**KOM Zrt.**” vagy „**Társaság**”) által megvalósítani tervezett Intelligens Hálózat Mintaprojekt (a továbbiakban: „**Mintaprojekt**”), valamint a Magyar Gáz Tranzit Zrt. által megvalósításra kerülő Magyarország és Szlovákia közötti rendszerösszekötő földgázvezeték megépítése (a továbbiakban együttesen: „**Beruházások**”).

Az Európai Unió Bizottsága a 2012. november 30-án kelt, C(2012) 8675 sz. határozatával jóváhagyta a Magyar Állam kérelmében foglaltakat, ezáltal lehetővé vált, hogy a 10c derogáción alapuló CO₂ kibocsátásból származó bevétel meghatározott része (a továbbiakban: „**Támogatás**”) a Mintaprojekt megvalósítása céljából kerüljön felhasználásra.

A Bizottság a Derogációs Kérelmet jóváhagyó határozatát követően megvizsgálta, hogy a projekt támogatás összeegyeztethető-e a belső piac működési mechanizmusával, azaz nem minősül-e versenytorzító hatású, tiltott állami támogatásnak. A Bizottság – vizsgálatának lefolytatását követően – a 2012. december 19-én kelt, C(2012) 9463 sz. határozatában megállapította, hogy az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSZ) 107. cikk (3) bekezdésének c) pontja értelmében a Támogatás összeegyeztethető a belső piaccal.

2017. január 1. napjától az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Mintaprojekttel kapcsolatos feladatai a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: „**NFM**”) főosztályaként működő Nemzeti Klímavédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: „**Hatóság**”) kerültek, akivel a Társaság Támogatási Szerződést (a továbbiakban: „**Támogatási Szerződés**”) kötött 2017. október 13. napján a Támogatás további folyósítása, továbbá a Mintaprojekt terjedelmének és célindikátorainak rögzítése, valamint a Mintaprojekt végrehajtása határidejének, egyben a beruházás befejezésének meghatározása érdekében.

A Nemzeti Tervvel összhangban, a Mintaprojekt alapvető célkitűzése az üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentési lehetőségeinek vizsgálata egy országos, összközműves (villamosenergia, földgáz, víz, távhő) okos hálózati rendszer bevezetése során. A Mintaprojekt feladata, hogy választ adjon az összközműves okos hálózati rendszer későbbi országos kiterjesztésének gazdaságossági kérdéseire, továbbá a beruházási elemek működési és üzemeltetési tapasztalatainak kiértékelésére.

2. Részletes jelentés

2.1. A tárgyév során a beruházással kapcsolatban felmerült költségek

A tárgyév során a beruházással kapcsolatban felmerült költségek listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.2. A tárgyév során a KOM Zrt. részére folyósított támogatások

A tárgyév során a Társaság 5 kifizetési igényt nyújtott be a Hatósághoz összesen 420 013 974 Ft és 2 251 352,48 Euró értékben az alábbiak szerint:

Megnevezés	Összeg	Benyújtás dátuma	Kifizetés dátuma
NFM-1. számú kifizetési igény	1.508.116,68 Euró	2017.09.26.	2017.12.27.
NFM-2. számú kifizetési igény	701.530,56 Euró	2017.09.26.	2017.12.27.
NFM-3. számú kifizetési igény	136.889.174 Ft	2017.09.26.	2017.12.27.
NFM-4. számú kifizetési igény	208.015.000 Ft	2017.09.26.	2017.12.27.
NFM-5. számú kifizetési igény	75.109.800 Ft és 41.705,24 Euró	2017.09.26.	2017.12.27.

A táblázatban szereplő kifizetési igények a Társaság 2016. novembere és 2017. júliusa közötti időszakban felmerült, támogatásból elszámolható dologi kiadásait, eszközbeszerzés költségeit, 2016. novembere és 2017. augusztusa közötti időszakban felmerült, támogatásból elszámolható személyi jellegű kiadásait, valamint a központi rendszer kiépítésének 7. számú mérföldkövének költségét tartalmazzák.

A Társaság további két kifizetési igényt nyújtott be a Hatósághoz a 2017. évben. A 2017. december 14. napján benyújtott 236.361.114 Ft és 142.298 Euró összegű NFM-6. számú kifizetési igény a 2017. augusztus-október közötti időszakban felmerült, támogatásból elszámolható dologi kiadásokat és eszközbeszerzés költségeket, valamint a 2017. szeptember-október közötti időszakban felmerült, támogatásból elszámolható személyi jellegű kiadásokat tartalmazza. A 2017. december 20. napján benyújtott 1.396.018,60 Euró összegű NFM-7. számú kifizetési igény a központi rendszer kiépítésének 8. mérföldkövét, valamint az opciós adatkezelési rendszer 3. ütemét tartalmazza. Elbírálásukra a 2018. évben kerül sor.

2.3. A beruházás fizikai előrehaladása a tárgyév során

Összefoglaló

A 2017. évben a Társaság folytatta a 2016. év negyedik negyedében elindított közbeszerzési eljárásokat, a Központi Okos Mérés és vezérlő rendszer kiépítését, továbbá a leszállításra kerülő okosmérők és okos mérést biztosító külön berendezések (a továbbiakban: „okosmérők”) felszerelését a Partnerprogram során kiválasztott végponti helyszínekre.

Iparági és egyéb partneri együttműködések

Az okos mérés bevezetésével kapcsolatos központi mintaprojekt megvalósításával összefüggő szabályokról szóló 26/2016. (II.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Okos Mérési Kormányrendelet”) alapján a Társaság együttműködési megállapodásokat kötött az érintett infrastruktúra-üzemeltetőkkel, valamint a Társaság által meghirdetett Partnerprogramba bejelentkezett versenypiaci szereplőkkel, önkormányzatokkal, háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: „HMKE”) üzemeltetőkkel és

energiakereskedőkkel, továbbá megkezdődött a 14. § (2) bekezdés b) pontja szerinti Záródokumentum (a továbbiakban: „Záródokumentum”) elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés.

A megállapodások alapján a Partnerek által megajánlott végpontok egyeztetése lezajlott az érintett infrastruktúra-üzemeltetőkkel, kijelölésre kerültek a Mintaprojektbe bevonható fogyasztási helyek.

Az iparági egyeztetések során mind a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „MEKH”), mind a MAVIR Zrt., mind pedig a villamosenergia-, illetve földgázelosztó társaságokkal folyamatos volt a szakmai párbeszéd a Mintaprojekt fókuszterületeit, a feladatmegosztást és az infrastruktúra-üzemeltetőkkel történő együttműködési kérdéseket illetően.

Beszerezési eljárások lebonyolítása

Az alábbi bontásban folytatódtak a Mintaprojekt sikeres megvalósításához szükséges beszerzési eljárások.

a) Végponti eszközök szállítása

A végponti eszközök szállítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban 2016. június 21. napján került sor az eredményhirdetésre. A 8 közbeszerzési részből 1 eredménytelenül, 7 eredményesen zárult. A nyertesekkel 2016. július elején megkötésre kerültek a keretmegállapodások. Az egyes közbeszerzési részekből lehívandó darabszám és mérőtípus igények a helyszíni bejárások és partneri egyeztetések eredményeként kerültek meghatározásra.

A végponti eszközök szállítására kötött keretmegállapodások közül három termékcsoport esetében került sor módosításra, mivel az ajánlatokban szereplő termékek gyártása megszűnt, azok cseréje vált szükségessé. Az új termékek a KOM Zrt., valamint a Független Mérnök szakemberei által az egyenértékűség tekintetében minősítésre kerültek.

2017. február hónapban az I., valamint a VIII. közbeszerzési rész tekintetében konzultációs eljárás lebonyolítására került sor, az adásvételi szerződések aláírásra kerültek. Az I. közbeszerzési rész vonatkozásában újabb konzultációs eljárást követően 2017. május hónapban is sor került egy újabb adásvételi szerződés aláírására. A II. közbeszerzési rész esetében 2017 júliusában sor került az újversenyeztetési eljárás lefolytatására, mely alapján az adásvételi szerződés is aláírásra került.

b) Helyszíni munkavégzés támogatása

A végponti eszközökkel kapcsolatos helyszíni munkavégzési szolgáltatás (végponti eszközök telepítése és üzemeltetés támogatása) beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás 2017 májusában elindult, a szerződéskötésre 2017 júliusában sor került.

c) Plusz végponti eszközök beszerzése

A Partnerprogramhoz kapcsolódó partneri egyeztetések során meghatározott végponti helyszínek felmérését követően további végponti eszköztípus igények merültek fel a villamosenergia, a távhő, valamint a víz iparágakban.

A 2016. október 19. napján „Távhő adatgyűjtés” tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, a szerződéskötés 2017. január 10. napján megtörtént.

A 2016. december 16. napján „Víz-mellékmérők és villamos fogyasztásmérők beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás is eredményesen zárult, a szerződéskötésre 2017. január hónapban került sor.

A partneri egyeztetéseket követően azonosított további végponti eszközök beszerzése érdekében újabb közbeszerzési eljárás indult 2017. szeptember 26. napján az ajánlati felhívás közzétételével, majd módosításával. Beérkeztek az ajánlatok, melyek felülvizsgálata megkezdődött. Az esetleges hiánypótlásokra, eredményhirdetésre, majd a szerződések megkötésére a 2018. évben kerül sor.

d) Társasház több közműves adatgyűjtése

A beszerzés célja több helyszínen olyan rendszer kialakítása, amely lokálisan összeköti a több közműből érkező információkat és azokat eljuttatja a KOM Zrt. mérésvezérlési központjába. Az eljárás 2017. október 4. napján az Összefoglaló Tájékoztató Közbeszerzési Hatóság számára történő megküldésével elindult. A közbeszerzési eljárás eredményesen zárult 2017. december 12. napján, a vállalozási szerződés aláírására a 2018. évben kerül sor.

e) LORA kommunikációs adatgyűjtés

A beszerzés célja egy új, nagy hatótávú és alacsony energiafogyasztású rádiófrekvenciás kommunikációs technológia tesztelése és alkalmazása, amely az eddig tesztelt technológiáknál sokkal nagyobb területi lefedettséggel bír, így a környezeti adottságoktól függően akár több kilométeres távolságból is sikeresen kinyerhetők a végpontokból az adatok, ez által költséghatékony megoldás lehet országos bevezetés esetén. A közbeszerzési eljárás 2017. november 24. napján az ajánlati felhívás közzétételével elindult, a beérkezett ajánlat elbírálására megkezdődött. Az esetleges hiánypótlásra, eredményhirdetésre, majd a szerződés megkötésére a 2018. évben kerül sor.

f) Záródokumentum elkészítésének támogatása

A 2017. március 10. napján „Záródokumentum elkészítésének támogatása” tárgyában indult versenyztetési eljárás eredményesen zárult, a vállalozási szerződés 2017. április 20. napján aláírásra került.

g) Intelligens Hálózat Mintaprojekt elindítása és társadalmi ismertség elérése

Kommunikációs feladatok tárgyában lezajlott a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közreműködésével a közbeszerzési eljárás, a vállalozási keretszerződés 2016. augusztus 29. napján aláírásra került. A további kommunikációs feladatok a leszállított kommunikációs stratégiában kerültek meghatározásra.

A stratégia alapján elkészült a Mintaprojektet és az okos mérést bemutató film. A Társaság több nyomtatott és online sajtótermékben helyezett el az okos mérés társadalmi ismertségének növelésére irányuló hirdetést. A Mintaprojektet bemutató rádiós interjúk készültek a Társaság képviselőivel. A Társaság részt vett több lakossági fórumon, továbbá kitelepült számos szakmai konferencián.

A KOM Zrt. a fenti eljáráson túl rendezvényszervezésre is lebonyolított egy közbeszerzési eljárást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal közreműködésével, amelynek nyertese a Társaság 2017. év végétől tervezett lakossági fórumait, workshop-jait, szakmai kitelepüléseit, valamint sajtótájékoztatóit köteles megrendezni.

A Mintaprojekt műszaki megvalósítása


A 2015. évben elindított és 2016. évben eredményesen lezárt „Rendszerintegráció - központi rendszer és telekommunikáció beszerzése és működtetése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a Sagemcom Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Rendszerintegrátor”) lett.

A Rendszerintegrátor a jelentés elkészítésének időpontjáig leszállította a vállalkozási szerződésében meghatározott 8 mérföldkő, valamint az opciós Adatkezelési rendszer eredménytermékeit. Elkészült(ek)

- a teljes adatközponti infrastruktúra (elsődleges adatközpont + másodlagos (DR) site),
- a mérési és vezérlési rendszer,
- az interaktív riportoló és analitikai alkalmazás,
- az energiamenedzsment, adatkezelési rendszer, összefüggés-vizsgálati funkciók,
- a rendszerhasználói portál (www.kozpontiokosmeres.hu),
- az eszközgazdálkodási rendszer,
- a központi rendszerfelügyelet és teljesítmény monitoring,
- a Service Desk,
- az integrációs platform (partnerek és infrastruktúra-üzemeltetők rendszereinek összekötése a mérési és vezérlési rendszerrel),
- a mérésadatgyűjtés teljes menetéről összeállított igényspecifikáció,
- az implementációhoz, valamint az üzemeltetéshez szükséges dokumentációk és tervek (Igényspecifikáció, Funkcionális terv, Rendszerterv, Implementációs terv, Tesztelési terv, Átfogó oktatási és vizsga terv),
- a munkautasítások, oktatási anyagok, valamint felhasználói és üzemeltetői leírások.

A rendszerintegráció ütemezését és jelenlegi státuszát az 1. ábra szemlélteti.

Leszállított termékek / mérföldkövek

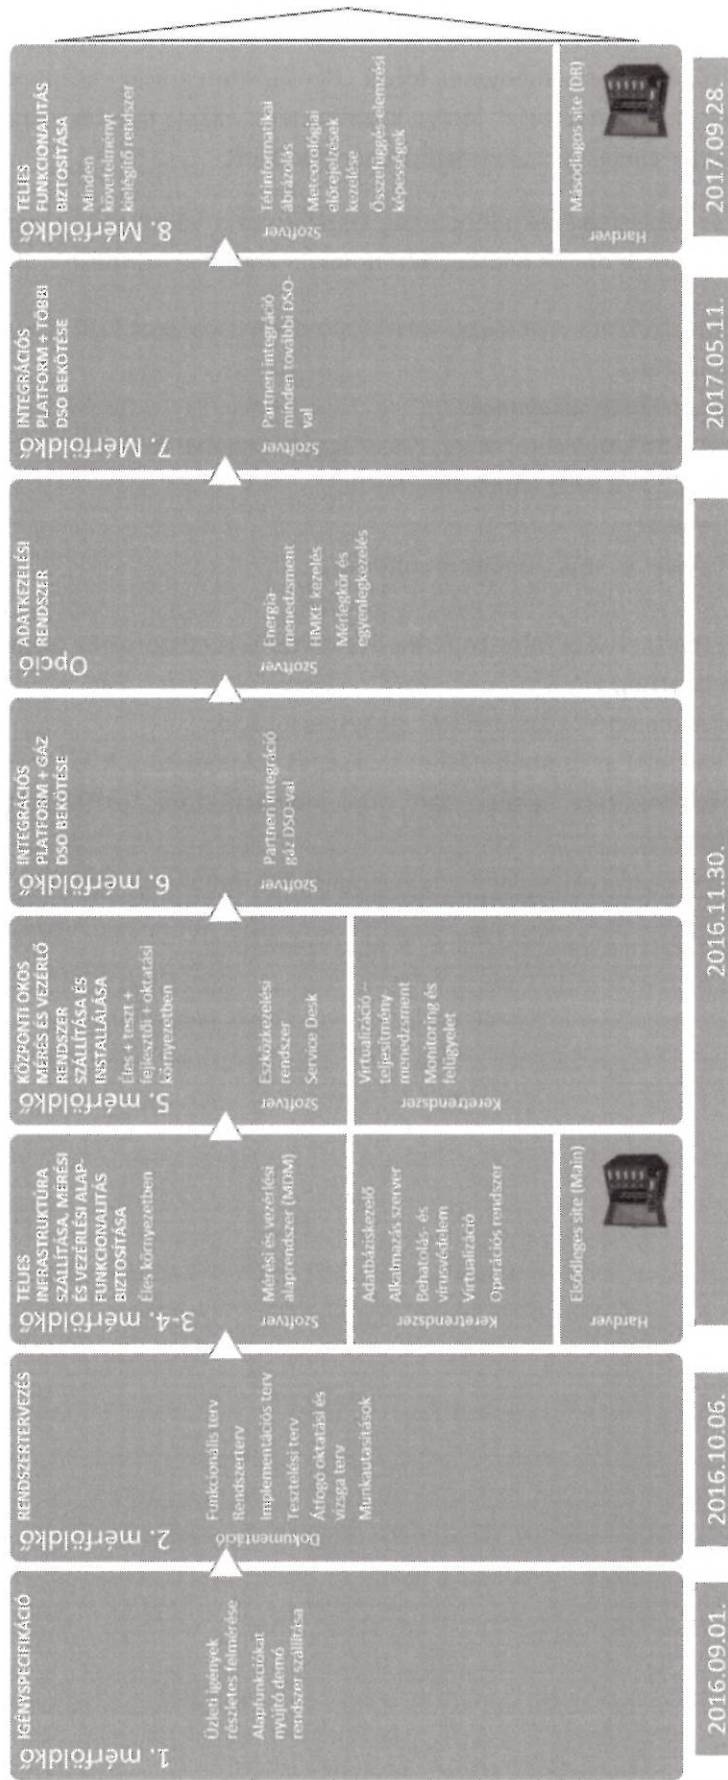

1. ábra Rendszerintegrációs mérföldkövek

A jelentés elkészítésének időpontjában az okosmérők és okos mérést biztosító külön berendezések felszerelése, valamint azok Mérésvezérlési központba való bekötése zajlik. A mérésvezérlési központ jelenleg több, mint 99 000 végpontról érkező mérési adatot kezel, amelyek iparágankénti bontását a 2. ábra szemlélteti.

(Handwritten signatures)

	Főváros				Vidék			Összesen bevont végpont (2017. december 31.)	Céllindikátor		Céllindikátor 2018. március 4.		
	2017. december 31.				2017. december 31.				2017. október 31.				
	Átadott eszköz	Telepített eszköz	Elért végpont	Egyéb forrásból adatszinten bevont végpont	Telepített eszköz	Elért végpont	Egyéb forrásból adatszinten bevont végpont		Főváros	Vidék			
Beszerezett eszköz				További bevonásra kerülő végpont (folyamatban lévő beszerzési eljárást követően)									
Villamos	10 433	9 838	40	17	2 650	480	7	13 614	500	3 500	2 000	20 000	
Földgáz	6 420	6 404	5 319	5 318	669	102	2 029	232	500	3 500	2 000	15 000	
Víz	4 628	4 592	4	2 283	-	811	18 832	-	-	1 000	20 000	21 500	
Távhő	1 678	1 678	-	-	-	168	53 645	-	-	1 000	50 000	50 000	
				Mindösszesen elért végpont, a projekt aktuális állása szerint					1 000	3 000	8 500	74 000	106 500

2. ábra Bevont végpontok darabszáma

2017. szeptember 1-jei céllindikátorok teljesültek, a táblázat a 2017. december 31-i állapotot szemlélteti. A korábbi infrastruktúra-üzemeltetői mintaprojektek során felszerelt okosmérők bevonásával a Mintaprojektben vizsgált végpontok száma meghaladja a 99 000 mérési végpontot.

2.4. A beruházás végrehajtását akadályozó rendkívüli események bemutatása

Megváltozott műszaki tartalom

Az NFM a 2013. december 19-i levelében hivatalosan tájékoztatta az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságát a Mintaprojekt műszaki terjedelmének CO₂ kvótaárak csökkenése miatti, a Mintaprojekt célját és eredményét nem veszélyeztető módon történő megváltozásáról, amely ellen a Főigazgatóság a 2014. február 7-én kelt, B2/MD/RVV/ad D*2014/058643 sz. levelében nem emelt kifogást. A Főigazgatóság levelében arról tájékoztatta az NFM-et, hogy lehetőség van a Mintaprojekt műszaki tartalmának csökkentésére a finanszírozáshoz szükséges bevételek csökkenése miatt, azzal a fenntartással, hogy a Mintaprojektnek ebben az esetben is meg kell felelnie az alkalmazandó uniós jogszabályoknak és előírásoknak. A Mintaprojekt végrehajtása a fentieknek megfelelően a Támogatás lecsökkent összegéhez igazodva, az eredetileg bevonni tervezett végponti darabszámok csökkentése mellett történik.

Ugyanakkor a közműellátás jelenlegi fogyasztásmérési helyzetének figyelembe vétele alapján indokoltá vált a Mintaprojektbe bevonásra kerülő végpontok közművek szerinti megosztásának módosítása az eredetileg megjelölt megosztástól. Ennek megfelelően a Mintaprojektbe bevont végpontok körülbelül 20-25 %-a kerül ki a villamosenergia- és a földgázszektorból, míg a többi végpontot a víziközmű- és a távhőszektorok adják. Elemzésre kerülnek a távhő és földgáz, illetve víz és villamosenergia közműiparágak közötti energiahatékonysági összefüggések, amelyek hatékony kihasználása további csökkenést eredményezhet a villamosenergia-csúcsfogyasztás és üvegházhatású-gáz kibocsátás területén. Ezáltal biztosítható, hogy Magyarország valamennyi közműiparágban megalapozott döntést tudjon hozni az okos mérés és az okos technológiák országos bevezetése kapcsán.

2017. szeptember 5. napján az NFM Klímapolitikai Főosztálya hivatalos levélben tájékoztatta az Európai Bizottság Éghajlatpolitikai Főigazgatóságát a Mintaprojekt felügyeletét ellátó hatóság személyében történt változásról, valamint a Mintaprojekt műszaki terjedelmének megváltozásáról. Az Éghajlatpolitikai Főigazgatóságtól 2017. december 8. napján érkeztek tisztázó kérdések a tájékoztatóban szereplő terjedelmváltozással kapcsolatban, melynek megválaszolása érdekében a Társaság 2017. december 15. napján készített egy nyilatkozatot az NFM számára a Nemzeti Terv céljainak és elvárt eredményeinek való megfeleléséről.

Szállítási, telepítési problémák

A villamos fogyasztásmérők telepítését a tervezett ütemezéshez képest lassította a fogyasztásmérők szállításához szükséges adategyeztetés az infrastruktúra-üzemeltetőkkel, valamint a közbeszerzésben nyertes ajánlattevő által eredetileg megajánlott termék cseréje. A villamos fogyasztásmérők telepítését a Társaság 2017 tavaszára tervezte, azonban a fenti okok miatt a telepítés csak 2017 decemberében kezdődhet meg.

A víz és földgáz fogyasztásmérők telepítése túlnyomórészt a tervezett határidőn belül megtörtént, azonban a 2. ábrán is bemutatott csekély darabszám esetében, néhány helyszínen még nem valósult meg. A fenti okok miatt fennáll annak a kockázata, hogy a végponti eszközök telepítése nem történik meg maradéktalanul a Mintaprojekt fizikai megvalósításának végső határidejéig.

2.5. A beruházás megvalósításának a tárgyévet követő évben tervezett ütemezése

A Társaság által a Mintaprojekt megvalósítása érdekében végzett eddigi tevékenységek az alábbiak:

- Szervezetépítés
- Regulátori, iparági és egyéb partneri egyeztetések
- Projekttervezés
- Beszerzési eljárások előkészítése, lefolytatása
- Implementáció megkezdése (mérésvezérlési rendszer és végponti eszközök telepítése)
- Társadalmi tudatformálás megkezdése (okosmérés népszerűsítése rendezvényeken, lakossági fórumokon, média megjelenések)
- Adatgyűjtés a Mintaprojekt kiértékeléséhez

A Mintaprojekt megvalósításának és zárásának felső szintű ütemezése a következő:

- | | |
|--|----------------------------|
| • A Mintaprojekt <u>megvalósítási fázisának</u> kezdőidőpontja (az Okos Mérési Kormányrendelet hatálybalépése): | 2016. március 4. |
| • Az <u>adatgyűjtés megkezdésének</u> határideje: | 2016. december 15. |
| • A Mintaprojekt <u>fizikai zárásának</u> (a beruházás befejezésének), valamint az Okos Mérési Kormányrendelet szerinti <u>Záródokumentum (első verziója) elkészítésének</u> határideje: | 2018. március 4. |
| • Az Okos Mérési Kormányrendelet szerinti <u>Záródokumentum, valamint a Derogációs Kormányrendelet szerinti Zárójelentés leadásának határideje</u> ¹ : | 2018. szeptember 4. |
| • A Mintaprojekt <u>lezárásának</u> (a Derogációs Kormányrendelet szerinti Zárójelentés elfogadásának) várható ideje ² : | 2018. december 4. |

¹ Derogációs Kormányrendelet: a villamosenergia-termelők részére az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény alapján történő derogációs kiosztás végrehajtási szabályairól szóló 341/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet. A szállítók késedelmes teljesítéséből vagy az okos mérők és okos mérést biztosító külön berendezések infrastruktúra-üzemeltetők általi késedelmes felszereléséből adódó csúszás esetén az adatgyűjtési időszak rövidülhet. 2018. szeptember 4-e a MEKH 441/2017 számú Határozata szerinti legkésőbbi határidő.

² A zárójelentés leadásának határideje megegyezik a záródokumentum leadásának határidejével, a zárójelentés elfogadásának – így a Mintaprojekt lezárásának – időpontja azonban a Hivatal hatásköre, várhatóan 3 hónap a zárójelentés leadásától számítva

